産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年4月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	19.31　t／月
金属くず	8.36　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	14.41　t／月
がれき類	0.00　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	23　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年4月15日
分析結果が得られた日	令和3年4月28日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	2mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※1			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年4月1日	令和3年4月1日	令和3年4月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※1			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	
測定方法			

※1　異常が認められた場合のみ記入すること。
※2　測定した際は写真を添付すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年5月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	32.10　t／月
金属くず	0.12　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	29.67　t／月
がれき類	0.00　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	20　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年5月18日
分析結果が得られた日	令和3年5月26日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※2			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年5月6日	令和3年5月6日	令和3年5月6日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※2			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	
測定方法			

※1　異常が認められた場合のみ記入すること。
※2　測定した際は写真を添付すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年6月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	18.53　t／月
金属くず	0.29　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	23.70　t／月
がれき類	0.96　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	24　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年6月22日
分析結果が得られた日	令和3年7月1日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※3			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年6月1日	令和3年6月1日	令和3年6月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※3			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	
測定方法			

※1　異常が認められた場合のみ記入すること。
※2　測定した際は写真を添付すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年7月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	33.82　t／月
金属くず	0.61　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	24.30　t／月
がれき類	0.26　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	22　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年7月6日
分析結果が得られた日	令和3年7月15日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1未満mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※4			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年7月1日	令和3年7月1日	令和3年7月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※4			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	
測定方法			

※1　異常が認められた場合のみ記入すること。
※2　測定した際は写真を添付すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年8月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	16.86　t／月
金属くず	3.15　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	23.60　t／月
がれき類	0.00　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	20　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年8月19日
分析結果が得られた日	令和3年9月2日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1未満mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※5			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年8月2日	令和3年8月2日	令和3年8月2日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※5			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	
測定方法			

※1　異常が認められた場合のみ記入すること。
※2　測定した際は写真を添付すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年9月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	23.45　t／月
金属くず	12.27　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	16.63　t／月
がれき類	1.09　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	22　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年9月10日
分析結果が得られた日	令和3年9月18日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1未満mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※6			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年9月1日	令和3年9月1日	令和3年9月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※6			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	
測定方法			

※1　異常が認められた場合のみ記入すること。
※2　測定した際は写真を添付すること。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年10月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	20.60　t／月
金属くず	1.18　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	18.85　t／月
がれき類	4.01　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	23　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年10月29日
分析結果が得られた日	令和3年11月24日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1未満mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☑ 有　☐ 無	☑ 有　☐ 無	☑ 有　☐ 無
採取場所	別紙図面１のとおり	別紙図面１のとおり	別紙図面１のとおり
採取日	令和3年10月29日	令和3年10月29日	令和3年10月29日
分析結果が得られた日	令和3年11月24日	令和3年11月24日	令和3年11月24日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異常の有無	☑ 有　☐ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容	令和3年11月24日 上流側観測井戸より鉛0.019mg/L(基準値0.01mg/L)の検出あり。直ちに新潟県、聖籠町、周辺集落区長へ報告。後日(11/30)新潟県新発田環境センター様と原因究明、対策について協議することとなった。		

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年10月1日	令和3年10月1日	令和3年10月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容			

残余容量

測定年月日	令和3年10月22日	測定結果	15,124m3
測定方法	搬入量より算定		

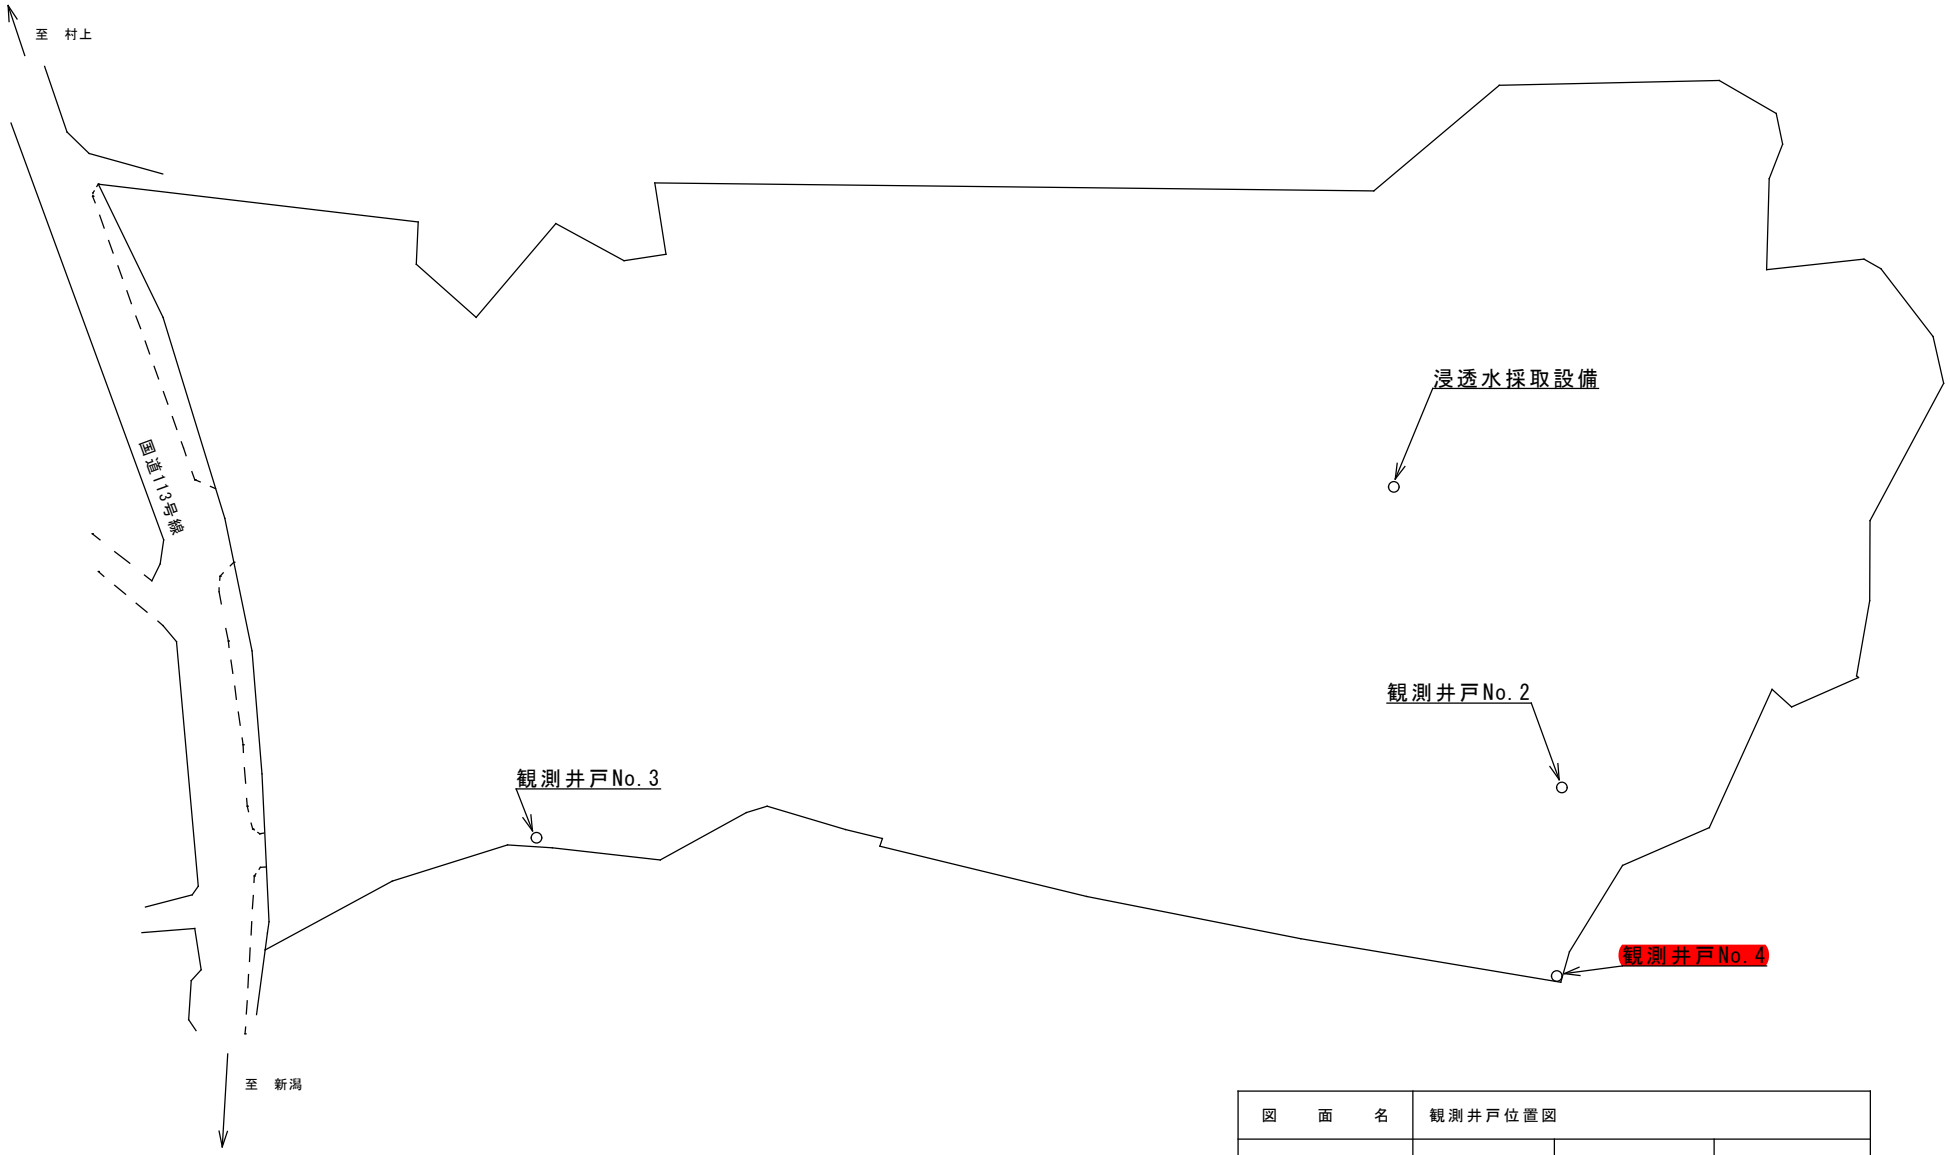

図　面　名	観測井戸位置図		
作成年月日	2018. 10. 29	作　成　者	星野　雄
曽　根　建　株　式　会　社			

別紙

水質検査の結果

(mg/L)

採取場所の略称 分析項目	浸透水 採取設備	No.3地下水 観測井戸	No.4地下水 観測井戸	基準値
アルキル水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
カドミウム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003
鉛	0.005未満	0.005未満	0.019	0.01
六価クロム	0.005未満	0.001未満	0.005未満	0.05
砒素	0.003	0.001	0.001未満	0.01
全シアン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
PCB	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
セレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年11月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	26.40　t／月
金属くず	5.86　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	33.57　t／月
がれき類	2.42　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	22　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年11月26日
分析結果が得られた日	令和3年12月7日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1未満mg/l
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※8	令和3年11月30日 新発田環境センターを訪問し、地下水水質異常の原因究明のための追跡調査について協議した。来月早々に観測井戸を一度洗浄し、再び水質検査を行うこととなった。		

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年11月1日	令和3年11月1日	令和3年11月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※8			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	
測定方法			

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和3年12月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	35.16　t／月
金属くず	2.21　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	30.03　t／月
がれき類	4.93　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	23　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和3年12月7日
分析結果が得られた日	令和3年12月16日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1mg/l未満
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※1	

水質検査の実施状況と措置

	周縁地下水（上流）	周縁地下水（下流）	浸透水
実施状況	☑ 有　☐ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所	No.4観測井戸		
採取日	12/2, 12/7		
分析結果が得られた日	12/9, 12/16		
分析結果	検出なし		
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※9	12/2　観測井戸を洗浄後に採水。鉛の分析を業者へ依頼。 12/7　再び採水。鉛の分析を業者へ依頼。 12/16 検査結果を入手。新潟県、聖籠町に報告。 今後も新潟県の指導に基づき追跡調査を行う予定。		

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和3年12月1日	令和3年12月1日	令和3年12月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容※9			

残余容量※2

測定年月日		測定結果	m3
測定方法			

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和4年1月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	4.50 t／月
金属くず	0.05 t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	12.38 t／月
がれき類	0.00 t／月
ゴムくず	0.00 t／月

展開検査の実施状況

実施回数	18 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和4年1月12日
分析結果が得られた日	令和4年1月21日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1mg/l
異常の有無	☐ 有 ☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

水質検査の実施状況と措置

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有 ☑ 無	☐ 有 ☑ 無	☐ 有 ☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和4年1月6日	令和4年1月6日	令和4年1月6日
異常の有無	☐ 有 ☑ 無	☐ 有 ☑ 無	☐ 有 ☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容			

残余容量

測定年月日		測定結果	m3
測定方法			

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和4年2月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	9.07　t／月
金属くず	6.42　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	9.51　t／月
がれき類	5.36　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	20　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和4年2月16日
分析結果が得られた日	令和4年3月1日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1mg/l未満
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和4年2月1日	令和4年2月1日	令和4年2月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容			

残余容量

測定年月日		測定結果	m3
測定方法			

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿［安定型］（令和4年3月）

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	21.14　t／月
金属くず	4.38　t／月
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	22.27　t／月
がれき類	6.72　t／月
ゴムくず	0.00　t／月

展開検査の実施状況

実施回数	24　回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた回数及び年月日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置

採取日	令和4年3月10日
分析結果が得られた日	令和4年3月23日
ＢＯＤ・~~ＣＯＤ~~	1mg/l未満
異常の有無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	

水質検査の実施状況と措置（年1回測定）

	周縁地下水(上流)	周縁地下水(下流)	浸透水
実施状況	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
採取場所			
採取日			
分析結果が得られた日			
分析結果			
異常の有無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無	☐ 有　☐ 無
必要な措置を講じた月日とその内容			

施設の点検

	擁壁	えん堤	掲示板
点検日	令和4年3月1日	令和4年3月1日	令和4年3月1日
異常の有無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無	☐ 有　☑ 無
必要な措置を講じた月日とその内容			

残余容量

測定年月日		測定結果	m3
測定方法			
